


	Atjaunojamā ēka
	Sastatņū / rakšanas zona
	leeja ēkā
	Nožogojums koku aizsardzībai
	Atklāta būvmateriālu novietne
	Pārvietojams būvgružu konteiners
	Strādnieku konteineru tipa ūģērbtuves
	Pārvietojams konteineru tipa ofiss
	BIO tualete
	Ugunsdzēsības komplekts
	Brīdinājuma zīmes
	Būvdarbu robeža - pagaidu nožogojuma līnija
	Papildu aizsargjumbtīni virs ieejām
	Uzstādāma kabeļu aizsargcaurule


1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi;
2. Lodziju margu demontāža un jaunu margu mērēšana;
3. Jūmta seguma siltināšana;
4. Fasādes siltināšana, t.sk. logu un durvju montāža;
5. Pamatu un cokola siltināšana;
6. Teritorijas labiekārtojums, t.sk. apmales ap ēku atjaunošana.

Cokola siltinājums

VAS "Latvijas dzelzceļš" kabelis.
Ap kabeli 100mm attālumā
cokla siltinājumu neuzstādīt.



Esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, celiem un ietvēm paredzēt ievietot divpusējās aizsargcaurulēs 750N

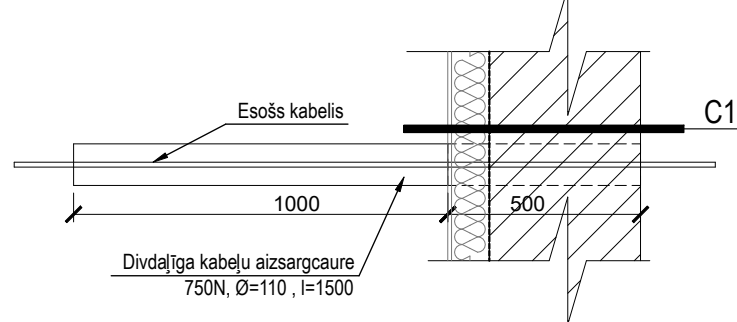

1. Teritoriju norobežot ar pagaidu žogu 2,2 m vai norobežojošu lenti;
2. Slēgtas instrumentu novietnes un darbinieku ģerbtuves iespējams ierīkot ēkas koplietošanas telpās, iepriekš saskaņojot ar ēkas īpašnieku;
3. Pagaidu elektrības un ūdens pieslēgumu saskaņot ar ēkas īpašniekiem uzsākot būvdarbus, būvuzņēmējām jānodrošina individuāli skaitītāji un jāveic ikmēneša apmaksas par patērēto elektroenerģiju un ūdeni;
4. Būvdarbi nemaina slodzes uz esošām konstrukcijām, tāpēc montāžas slodžu shēma nav nepieciešama;
5. Inženierkomunikāciju tuvumā ievērot aizsargjoslu 1m un tā zonā rakšanu veikt manuāli, neizmantojot mehāniskas ierīces, kā arī neveikt materiālu u.c. smagu priekšmetu novietošanu;
6. Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējām jāizstrādā un jāsaņem Darbu veikšanas projekts, kas izstrādāts pamatojoties uz Darbu organizēšanas projektu;
7. Ja būvdarbu laikā tiek bojāts zāliens, piebraucamie ceļi vai citi elementi, tie jāatjauno!
8. Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiek pārtraukta;
9. Veicot jumta siltināšanu, materiālu nokraušana nepārsniedz 100 kg/m². Pēc iespējas materiālus uz jumta neuzglabāt. Nokraušana izmantot tikai Tsilaicīgi!
10. Esošo koku aizsardzībai uzstādīt nožogojumus 2,5m augstuma vai visa koka/krūma augstumā, atkarībā no tā, kurš nosacījums izpildās pirmais.
11. Inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši norādēm AR un DOP skaidrojošā aprakstā.
12. Būvniecības ierosinātais apjoms PEST pārvietošanas darbus saskaņot ar tajos iesaistīto būvju/ēku īpašniekiem/pārvaldniekiem.
13. Ārējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa temperatūra trīs dienu laikā nav zemāka par +4C.
14. Pēc darbu pabeigšanas jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu kabelu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošai institūcijai.

Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv		Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114 Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Objekta adrese: Pionieru iela 86, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 Lapas nosaukums: Būvdarbu ģenerālplāns
---	---	--
