




x=198500
y=657900

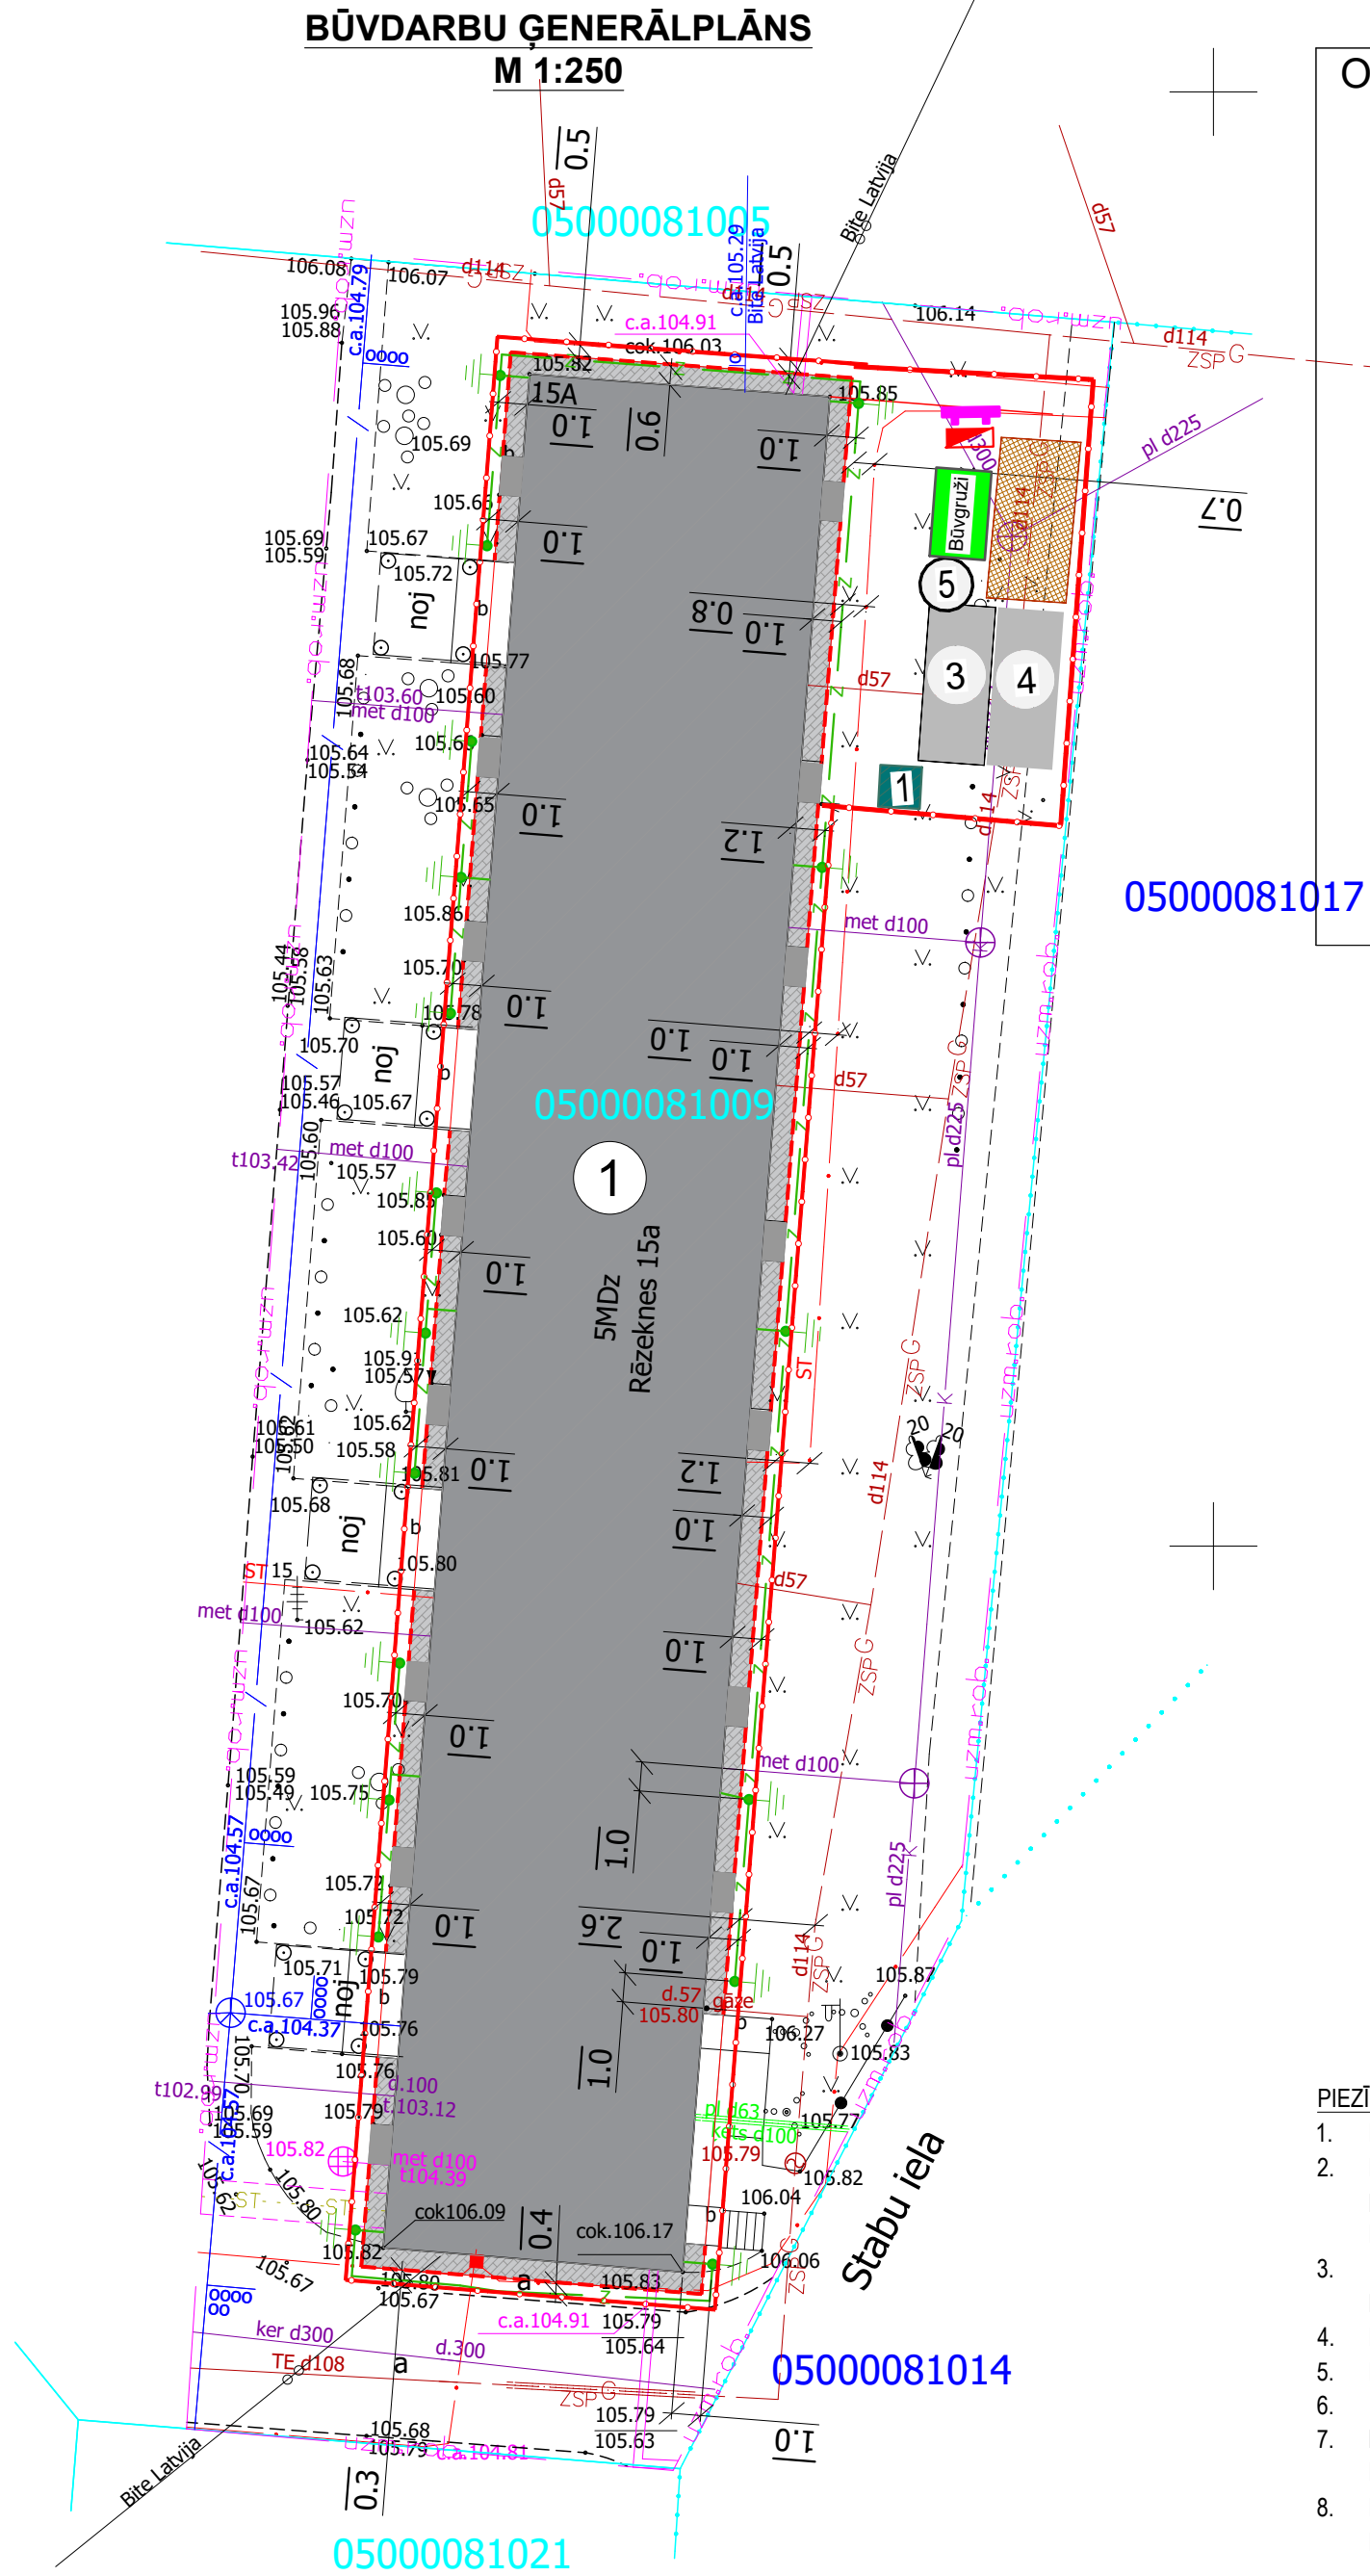

Objekta izvietojuma shēma

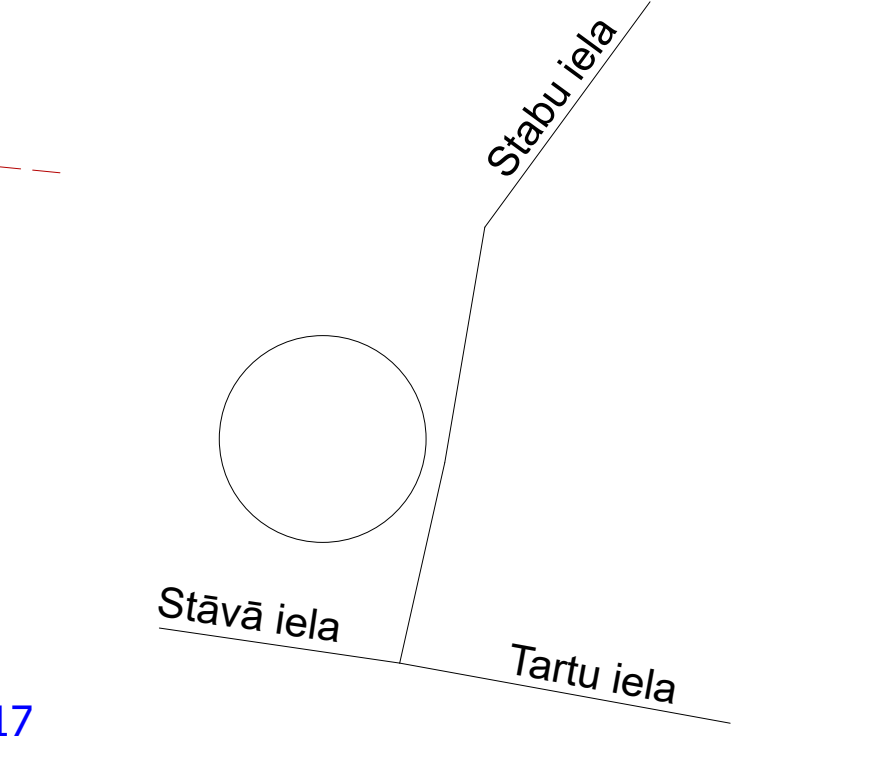


PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI		
NR.P.K.	APZĪMĒJUMS	
1		PROJ.ĒKA
2		ZEMES GABALA ROBEŽAS
3		ATJAUNOJAMAS ZĀLIENS
4		PROJ. BETONA BRUĢA (200x100x50) NOMALE
5		PROJ. BETONA IETVES APMALES BR100.20.8
6		PAGaidu BŪVŽOGS
7		BŪVMATERIĀLU NOKRAUTNE

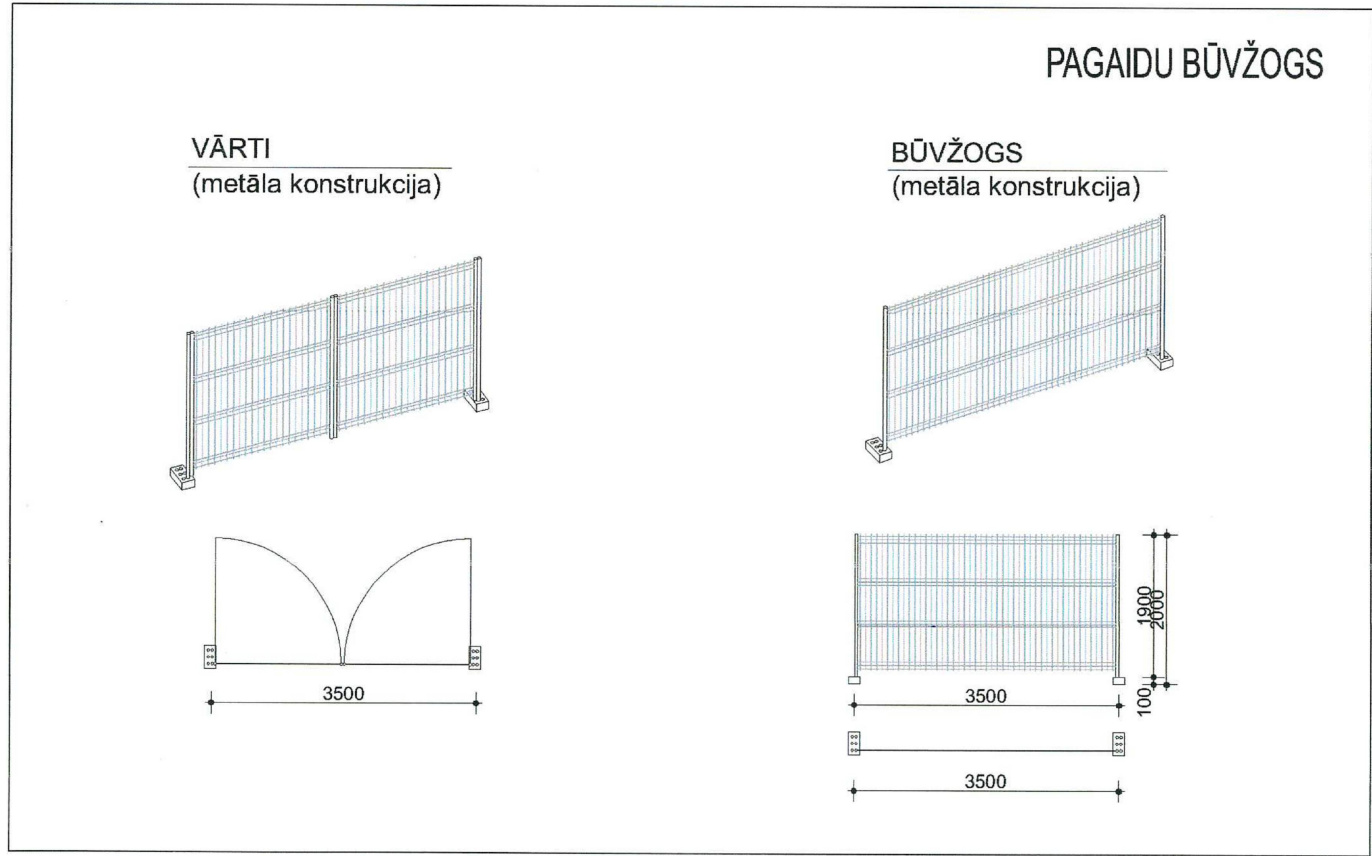

Būvlaukuma objektu eksplikācija		
N.p.k.	Nosaukums	Apjoms
1	Atjaunojama ēka - Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja	
2	Biotualetes	1 gab.
3	Būvdarbu vadītāju un būvuzraugu telpa.Sapulces telpa	1 gab.
4	Celtniecības modulis-Sadzīves telpa strādniekiem	1 gab.
5	Utilizējamo būvgružu konteiners	1 gab.

ESOŠO KOKU AIZSARDZĪBA

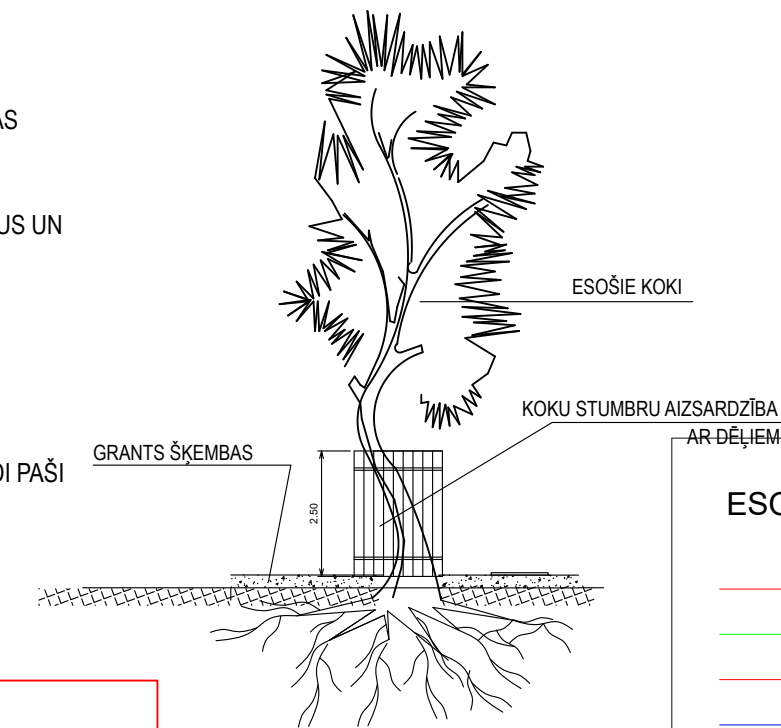

ESOŠO INŽENIERTĪKLU APZĪMĒJUMI :

—•—	0.4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
—•—	ŪDENSVADS (PAZEMES)
—•—	6-20 KV VIRSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
—/—	ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA
—•—	PAZEMES SILTUMTRASE
—•—	APGAISMES KABELIS
—•—	LIETUS KANALIZĀCIJAS PAŠTECES VADS
—•—	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURULVADS

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA:

APZĪM.		STĀVU SKAITS	CC KLASIFIK.	ĒKAS GRUPA
1.	PROJEKTĒTĀ DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA (Kad.apz.05000081009001) RĒZEKNES IELĀ 15A, DAUGAVPILS	5	1122	II

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI PROJEKTĒŠANAS ROBEŽĀS

NR. P. K.	NOSAUKUMS	DAUDZUMS
1.	ZEMES GABALS AR KADAŠTRA APZ. NR.05000081009	3170 M²
2.	APBŪVES LAUKUMS	671,0 M²
3.	APBŪVES AUGSTUMS	16.18 M
4.	APBŪVES BLĪVUMS	27%
5.	APBŪVES INTENSITĀTE	135%

ĒKU TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Nr. p.k.	RĀDĪTĀJS	DZĪVOJAMĀ MĀJA
1.	ĒKAS KLASIFIKĀCIJA PĒC CC KLASIFIKATORA	11220103
2.	ĒKAS LIETOŠANAS VEIDS (PĒC LBN 201-15)	I
3.	ĒKAS GRUPA ATBILSTOŠI BŪVNIC. PROCESAM	II
4.	ĒKAS UGUNSNOTURĪBAS PAKĀPE	U2a
5.	ĒKAS STĀVU SKAITS	5
6.	ĒKAS PAZEMES STĀVU SKAITS	1
7.	ĒKAS APBŪVES LAUKUMS	671,0 M²
8.	ĒKAS BŪVTILPUMS	10963 M³
9.	ĒKAS KOPEJĀ LAUKUMS	3305,3 M²

PIEZĪMES:

- PASKAIDROJUMA RAKSTS IZSTRĀDĀTS, PAMATOJOTIES UZ PASŪTĪTĀJA DOTO TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU (PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMU) UN LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMDOŠANAS PRAŠĪBĀM.
- IZMĒRI DOTI METROS.
- VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.
- PAR NOSACĪTO ATZĪMI ±0.00 PIENĒMTS ĒKAS 1. STĀVA TĪRAS GRĪDAS LĪMENIS.
- RASĒJUMU NEDRĪKST MĒRĪT, JĀVADĀS PĒC RAKSTĪTĀJIEM IZMĒRIEM.
- NEKSAIDRĪBU VAI ŠAUBU GADĪJUMĀ VĒRSTIES PIE BŪVPROJEKTA AUTORIEM.
- VISI IZMĒRI UN PIESAISTES PRECIZĒJAMI BŪVĒ.
- ĢENERĀLAIS PLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "ENERGOMONTĀŽPROJEKTS" 2025. GADA MAIJĀ SAGATAVOTĀ TOPOGRĀFISKĀ PLĀNĀ.
- BŪVUZŅĒMĒJAM JĀIZSTRĀDĀ VISU ARHITEKTŪRAS ELEMENTU UN MEZGLU DARBA RASĒJUMI, KAS JĀSASKAŅO AR PROJEKTA ARHITEKTU UN BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJU.
- SASTĀDOT BŪVDARBU TĀMI, JĀAPLŪKO BŪVPROJEKTA DOKUMENTĀCIJA KOPUMĀ, NE TIKAI MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS.
- PROJEKTA LAPĀS UN SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTI PROVIZORISKIE DARBU UN APJOMU MATERIĀLI UN IZMĒRI, KĀDUS VARĒJA KONSTATĒT PROJEKTĒŠANAS GAITĀ. DARBU REALIZĀCIJAS GAITĀ IZMĒRI UN APJOMI VAR MAINĪTIES. IZMĒRU UN APJOMU IESPĒJAMĀM SVĀRSTĪBĀM JĀBŪT IETVERTĀM BŪVNICĪBAS TĀMĒ.
- VISUS PROJEKTĀ NORĀDĪTOS MATERIĀLUS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR CITIEM EKIVALENTIEM, LATVIJĀ CERTIFICĒTIEM, TEHNISKAJĀ UN ESTĒTISKAJĀ ZIŅĀ LĪDZVĒRTĪGIEM VAI LABĀKIEM MATERIĀLIEM. MATERIĀLU VAI IZSTRĀDĀJUMU NOMAĪŅA SASKAŅOJAMA AR PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJU UN BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJU.
- PIRMS MATERIĀLU UN KONSTRUKCIJU PASŪTĪŠANAS UN IZGATAVOŠANAS VEIKT VISU IZMĒRU UN PIESAISTU KONTROLUZMĒRĪJUMUS OBJEKTĀ.
- MONTĀŽAS DARBI UN PĀRBAUDE VEICAMA SASKAŅĀ AR BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ IEVĒROJOT MATERIĀLU UN IEKĀRTU PIEGĀDĀTĀJFIRMU TEHNISKOS NORĀDĪJUMUS.
- DARBU IZPILDES GAITĀ JĀIEVĒRO DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI, BŪVDARBU TEHNOLOĢISKIE NOTEIKUMI, MATERIĀLU IZGATAVOTĀJU PRAŠĪBAS DARBU VEIKŠANAI, KĀ ARĪ VISI PROJEKTA DAĻĀS UN SADAĻĀS DOTIE NORĀDĪJUMI.
- VISAS ATKĀPES NO RASĒJUMIEM UN IZMAIŅAS JĀSASKAŅO AR BŪVPROJEKTA AUTORIEM.
- ŠIE NOSACĪJUMI ATTIECAS UZ VISĀM LAPĀM ŠAJĀ SĒJUMĀ.
- PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT ESOŠOS SOĻIŅUS UN PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS MONTĒT ATPAKAĻ.
- PRAŠĪBAS MATERIĀLIEM UN BŪVDARBU TEHNOLOĢIJĀM ATBILSTOŠI "AUTOCEĻU BŪVDARBU SPECIFIKĀCIJAS 2023" PRAŠĪBĀM.

BITE:
Saglabāt "BITE" esošos tīklus.
PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS PIEAICINĀT SIA „BITE” SPECIĀLISTUS t. 27018988
Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt esošo "BITE" tīklu fotofiksāciju.
Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt esošo "BITE" tīklu fotofiksāciju.

TET:
Saglabāt esošos "TET" komunikācijas tīklus.
PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS PIEAICINĀT SIA „TET” SPECIĀLISTUS
Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt esošo "TET" komunikāciju tīklu pārbaudi "TET" pārstāvja klātbūtnē.

"SADALES TĪKLS"
Saglabāt "SADALES TĪKLS" esošos tīklus.
PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS PIEAICINĀT AS „SADALES TĪKLS” SPECIĀLISTUS
Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt esošo "SADALES TĪKLS" tīklu fotofiksāciju.
Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt esošo "SADALES TĪKLS" tīklu fotofiksāciju.
