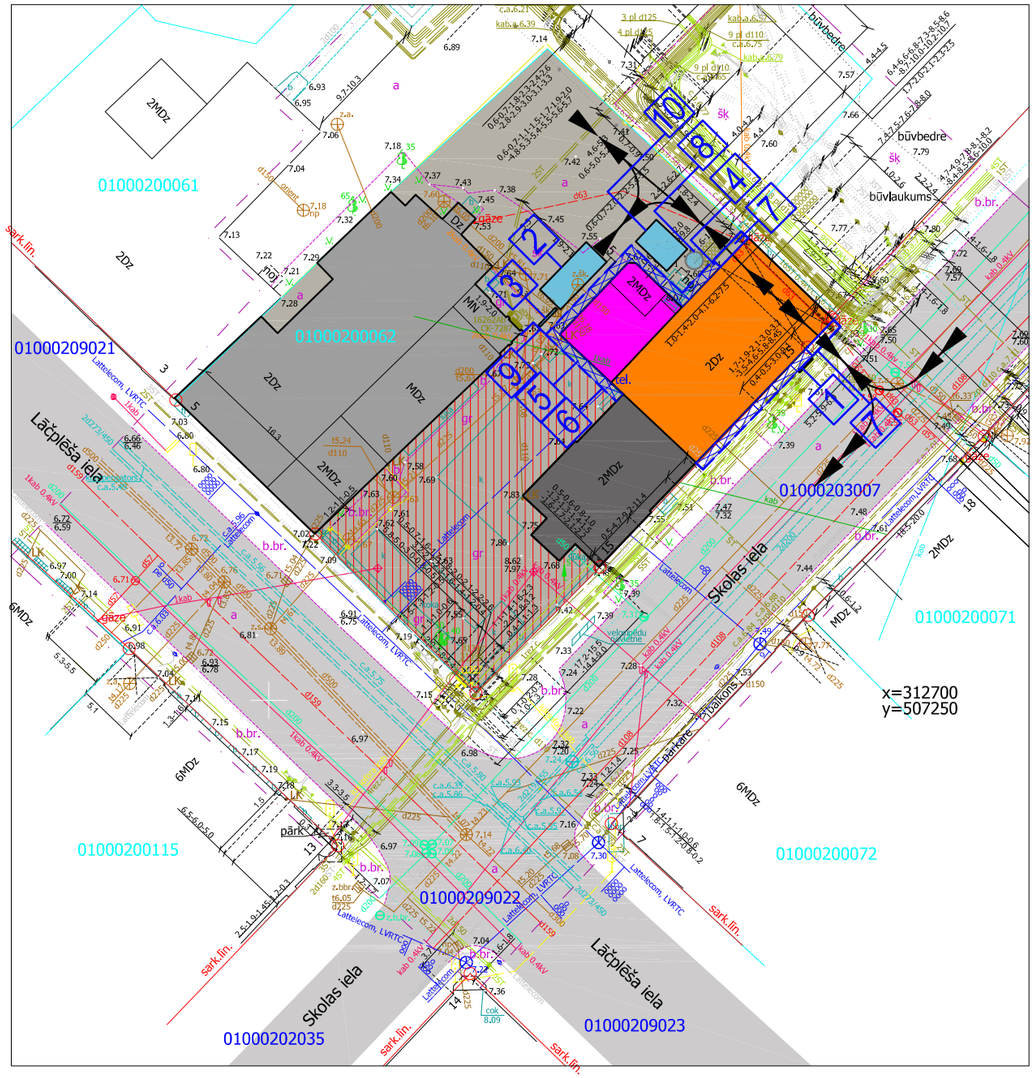


Vispārējie norādījumi

1. Norādījumus par ēkas pārbūves darbu būvlaukuma organizēšanu un būvdarbu veikšanu skatīt skaidrojošajā aprakstā.
2. Savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju pirms būvdarbu uzsākšanas.
3. Pirms darbu uzsākšanas veikt esošo ēku un zemes īpašnieku brīdināšanu par veicamajiem darbiem atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.
4. Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts.
5. Veicot būvniecības darbus privātos gruntsgabalos vai ēkās, pēc darba beigšanas nodot objektu zemes vai ēkas īpašniekam vai pilnvarotajam pārstāvim.
6. Pirms darbu uzsākšanas personāls jāiepazīstina ar iekšējās kārtības noteikumiem un jāizved darba drošības instruktāža ar attiecīgu ierakstu darba drošības žurnālā.
7. Objektā jānorīko atbildīgais par ugunsdrošību un jāveic visi pasākumi ugunsdrošības noteikumu izpildei.
8. Visām personām darba zonā lietot aizsargķiveres.
9. Visus celtniecības darbus izpildīt saskaņā ar LR MK 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
10. Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu ievērošanu veicot būvdarbus.
11. Par Skolas ielas ietves izmantošanu būvlaukuma vajadzībām slēdzams līgums ar Rīgas domi.

Izmantoto dokumentu un normatīvu saraksts:

1. LR MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
2. LR MK 25.02.2003. noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus".
3. LR MK 17.02.2004.noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi".
4. LBN 310 - 14 "Darbu veikšanas projekts".

APZĪMĒJUMI

- Pārbūvējamā ēkas iekšpagalma daļa
- Pamatu vainagsijas, sienu karkasa, bēniņu pārseguma, fasāžu labošanas, stiprināšanas/ lifta šahtas, sanmezglu pārbūves daļa
- Nepārbūvējamā ēkas daļa
- Teritorija, kas netiek skarta būvdarbu laikā.
- Transporta ceļi un virzieni
- (1) Būvtāfele
- (2) Būvgružu konteiners
- (3) Ugunsdzēsības stends
- (4) Pacēlājs "SIMON TOPPER" - 1gab.
- (5) Sastatnes /3.klase/
- (6) Aizsargtīkls
- (7) Armēts caurbrauktuves portāls
- (8) Biotualete WC - 1kompl.
- (9) Teritorijas nožogojums
- (10) Būvizstrādājumu un materiālu novietne

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs **Renārs Putniņš**
Sert. N° 1-00439

2019.gada 2. decembrī .....

Šīs būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs **Renārs Putniņš**
Sert. N° 1-00439

2019.gada 2. decembrī .....

DOP MARKAS KOMPLEKTA DARBA RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	Rasējuma lapas nosaukums	Lapas Nr.	Piezīmes
1.	Vispārējie norādījumi. Situācijas plāns. Būvlaukuma organizēšanas shēma.	DOP - 1	

BP/ BP DAĻAS VADĪTĀJS	Renārs Putniņš	PROJEKTA DAĻA / STADIJA	DOP/ BP
ARHITEKTI	Anda Ābele Jānis Rudzītis	RASĒJUMS	BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS SHĒMA MONTĀŽAS DARBU ĢENERĀLPLĀNS
PASŪTĪTĀJS	SIA"Kaņepes Kultūras centrs"	RASĒJUMA Nr.	DOP-01
		PROJ. Nr./ ARHĪVA. Nr.	2018_42
OBJEKTS	Ēkas konstruktīvās noturības atjaunošana un daļas pārbūve, Skolas iela 15, Rīga, LV-1010, (k.nr.01000200062002)	MĒROGS	1:500
		DATUMS	02.12.2019

Būvkom.reģ.nr. 13605
Pērses iela 14-3,Rīga,
LV-1011, t. + 371 29116075,
t.: + 371 25608122, +371 94167 68
e-pasts: malus.arhit@gmail.com

MA LŪS ARHITEKTI
