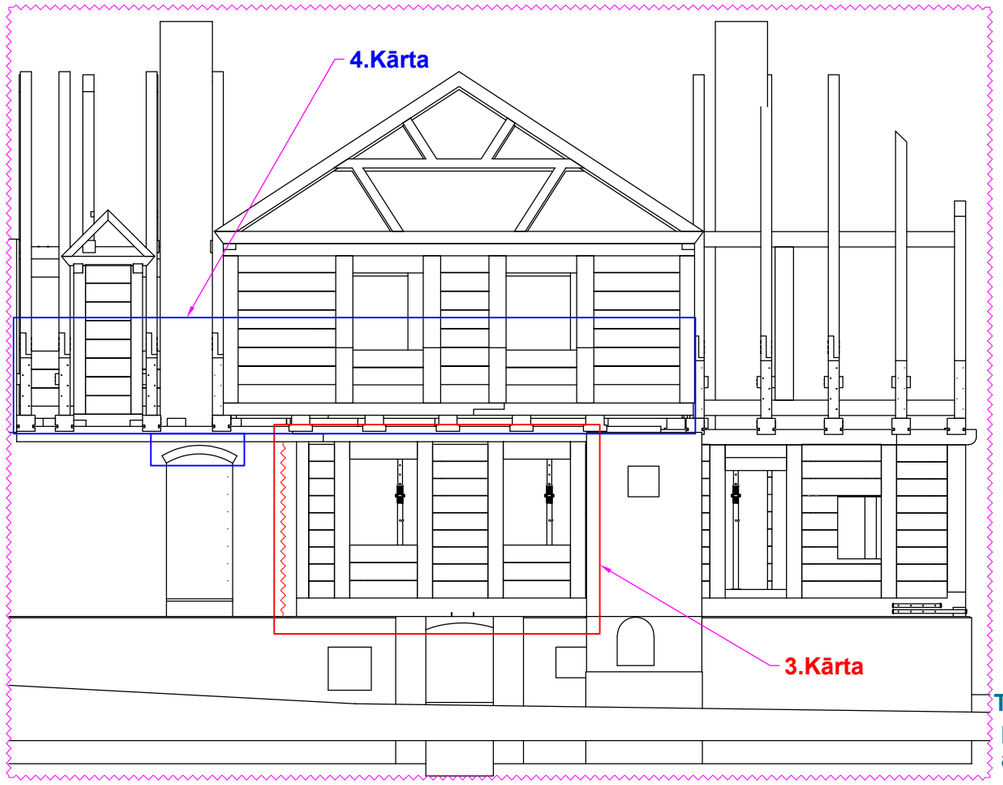



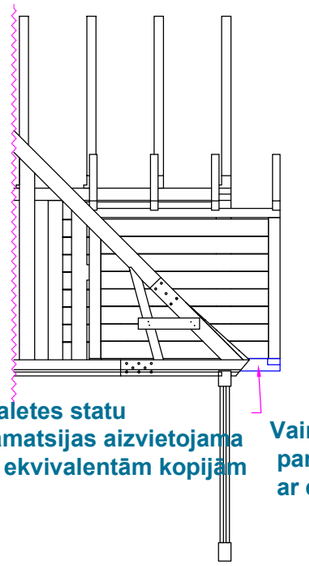

Tualetes statu
pamatsijas aizvietojama
ar ekvivalentām kopijām

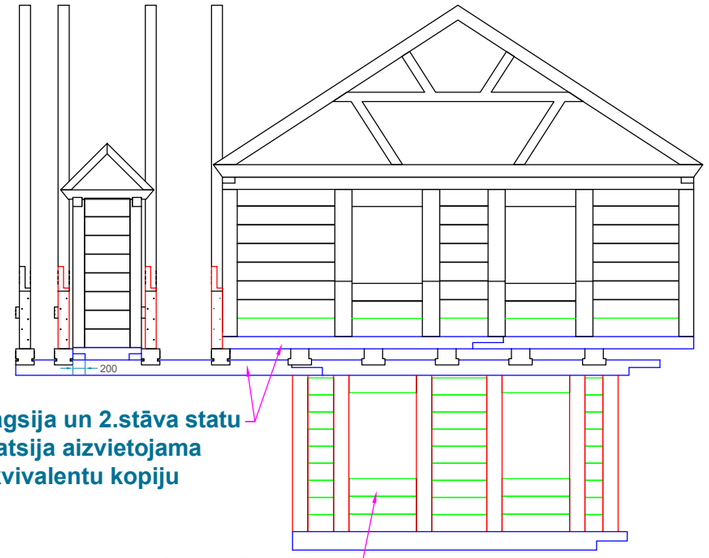

Vainagsija un 2.stāva statu
pamatsija aizvietojama
ar ekvivalentu kopiju

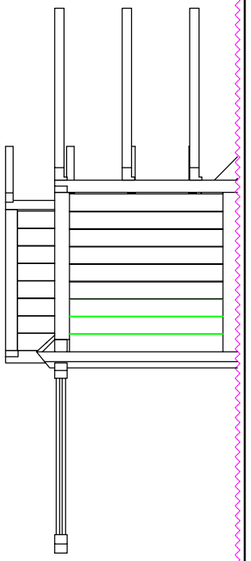

Izmantojami esošie guļšķautņi
pielāgojot vēsturiskajai situācijai



Atjaunojama tualetes grīda
izbūves zonā aiz ēkas ārsienas

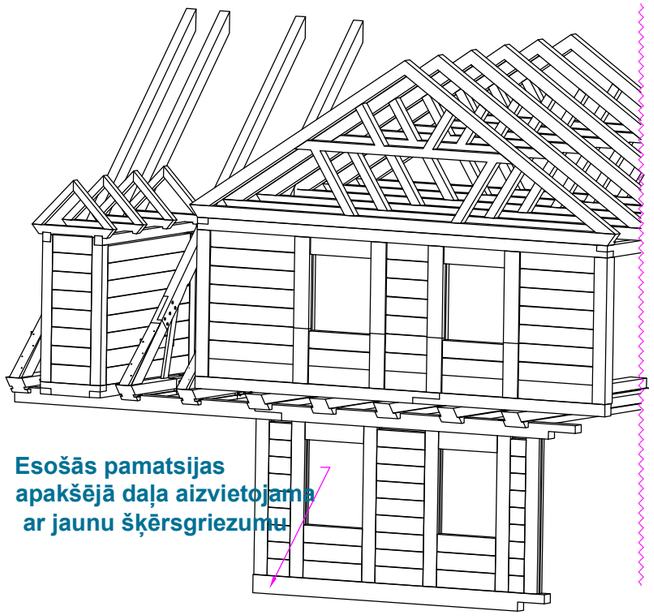

Esošās pamatsijas
apakšējā daļa aizvietojama
ar jaunu šķērsgriezumu

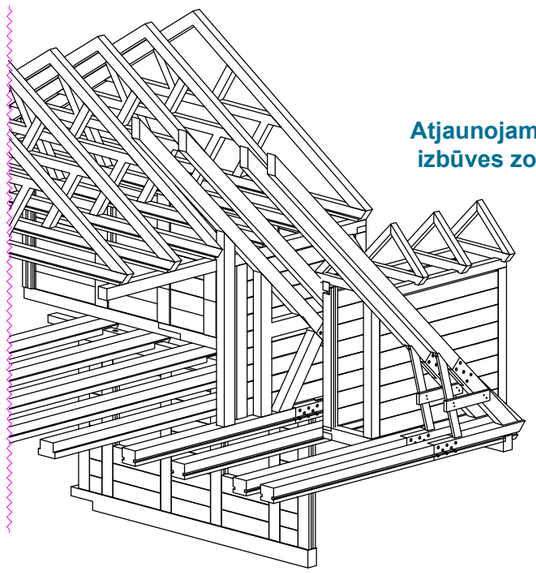

Demontāžas-montāžas tehnoloģija:
Izmantot PEP ERGO cinkotas tērauda stutes:
a. Stutes vieglais svars (19,4 kg),
b. Uzgriežņa regulēšanas diapazons ir 12 cm,
c. Slodžu nestspēja 50 kN.

1. Stutu palikņiem jābūt uz stabilas pamatnes un perpendikulāri pagaidu stutēm.
2. 1.un 2.stāvu balstu sistēmai vertikālē jāsakrīt.
3. Pagaidu stutu garumu pieregulēt pēc fakta. (atkarīgs no stāvu augstuma.)
4. Ēkas pārseguma siju daļu izcelt līdz minimālam atrāvienam no nesošās sienas konstrukcijas.
5. Pie jebkurām, nesošo vai balsta konstrukciju, statiskās nestsbilitātes pazīmēm, darbus pārtraukt un izsaukt būvinženieri situācijas risināšanai.
6. Demontēt 1. un 2.stāva ārsienas daļu remonta zonas konstrukcijas.
7. Pēc demontāžas pieaicināt būvinženieri situācijas fiksācijai un nepieciešamības gadījumā, papildus risinājumu izstrādei.
8. Montēt, atjaunot un protezēt nesošās konstrukcijas atbilstoši ēkas būvniecības secībai (no lejas uz augšu).
9. Tikai pēc pilnīgas visu konstruktīvo elementu un savienojuma mezglu izbūvēs, drīkst atslogot balstu konstrukciju.

SIA "ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA",
Reģ. Nr. 40003041528
Arsenāla iela 3, Rīga, LV-1050

"SCW constructions",
Reģ. Nr. 42103068673,BKR Nr.13125
Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456

Izstrāde	Vārds, uzvārds	Paraksts	Dat.
BPV	M. Mihailova Sert. nr. 1-00310		20/03/2025
BPDV	I. Štāls Sert. nr. 3-02054		20/03/2025
Izstrādāja	I. Štāls		

PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS POLISES **Nr. LV24-L4-00000739-5**

Būvprojekts:	FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. JUMTA SEGUMA MAIŅA ASIS 1-3
Būvniecības ierosinātājs:	SIA "ANNA PAULA"
Zemes vienības adrese:	DIENVIDKURZEMES NOVADS, AIZPUTE, ATMODAS IELA 5. LV-3456.

Pasūtījuma /arhīva/ NR. **42-28.10.2020**

KADASTRA NR.:		STADIJA	Lapas formāts	LAPA
64050070024	**BK - Būvkonstrukcijas**	**BP**	A3	BK-10

Rasējums: **3., 4. Kārta**.
Fasādes 1-3 uz ass C, bojātās koka sienas daļas un 1.stāva pārsegumu atjaunošana. Elementu un mezglu izvietojums.

MĒROGS M 1:100
