
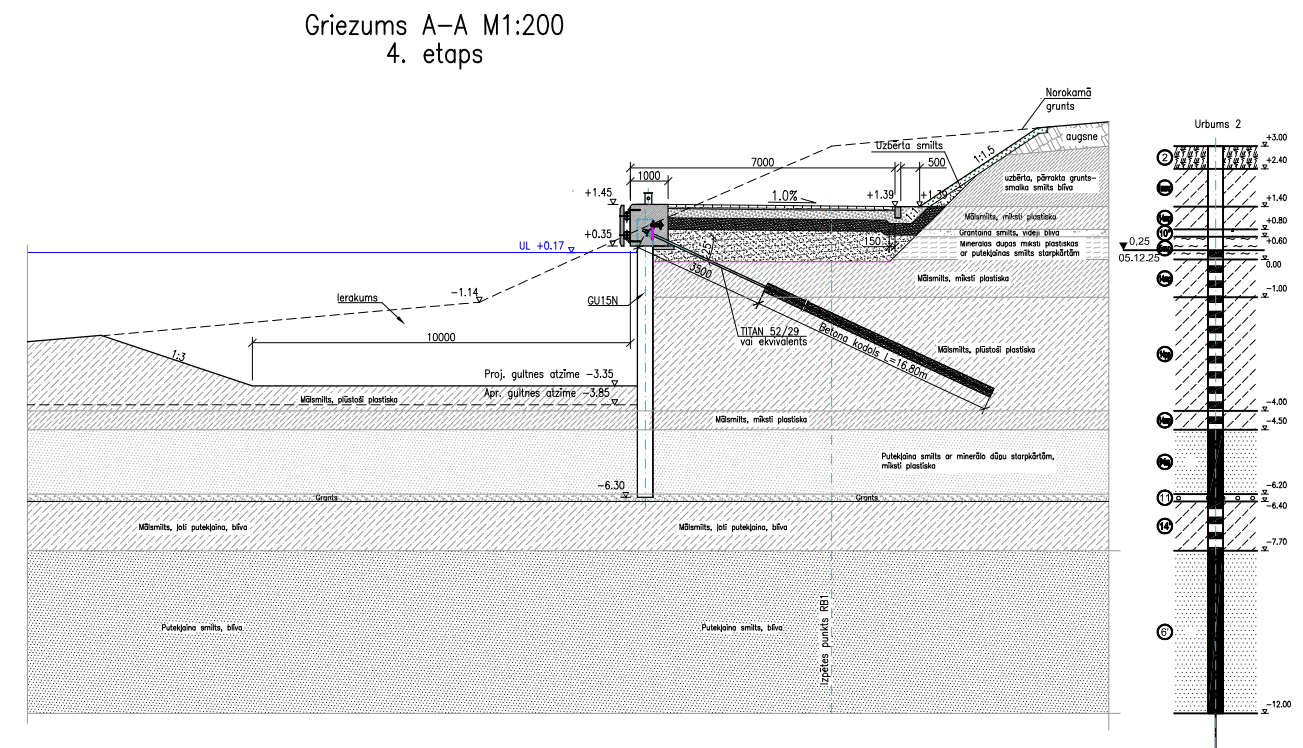
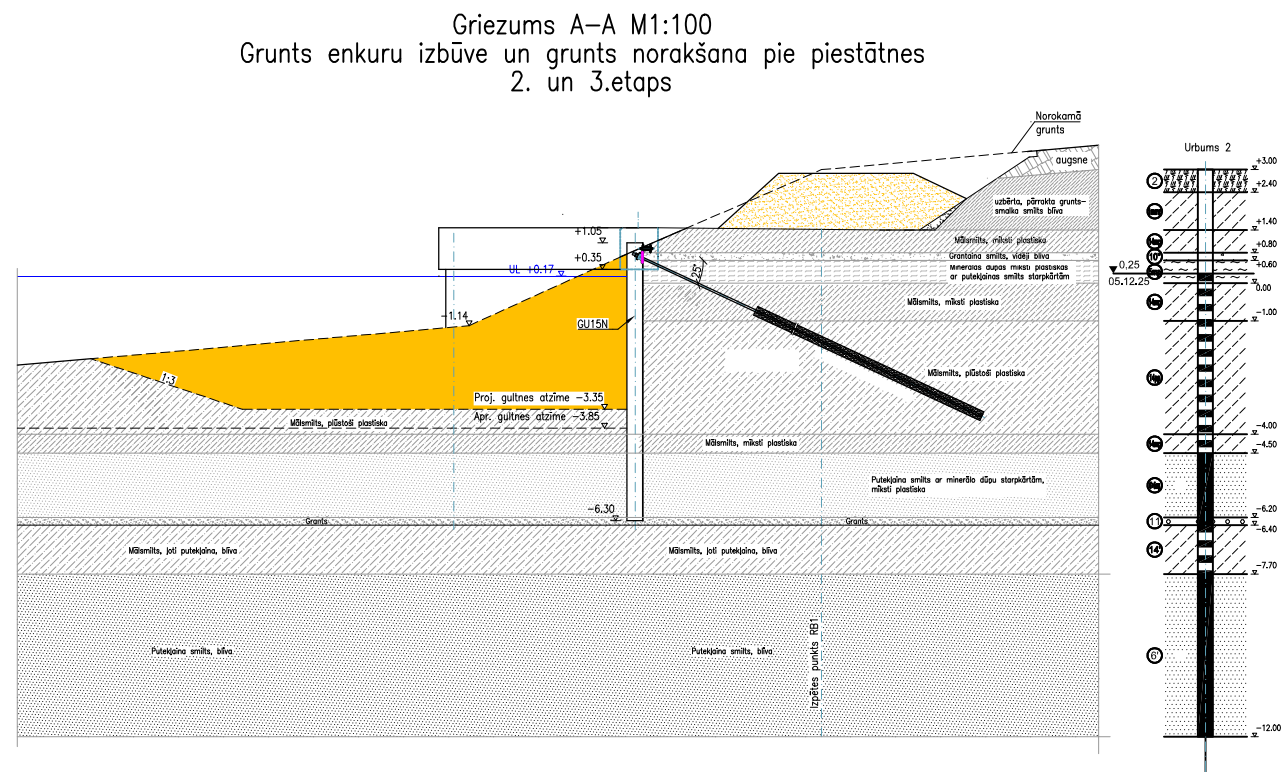


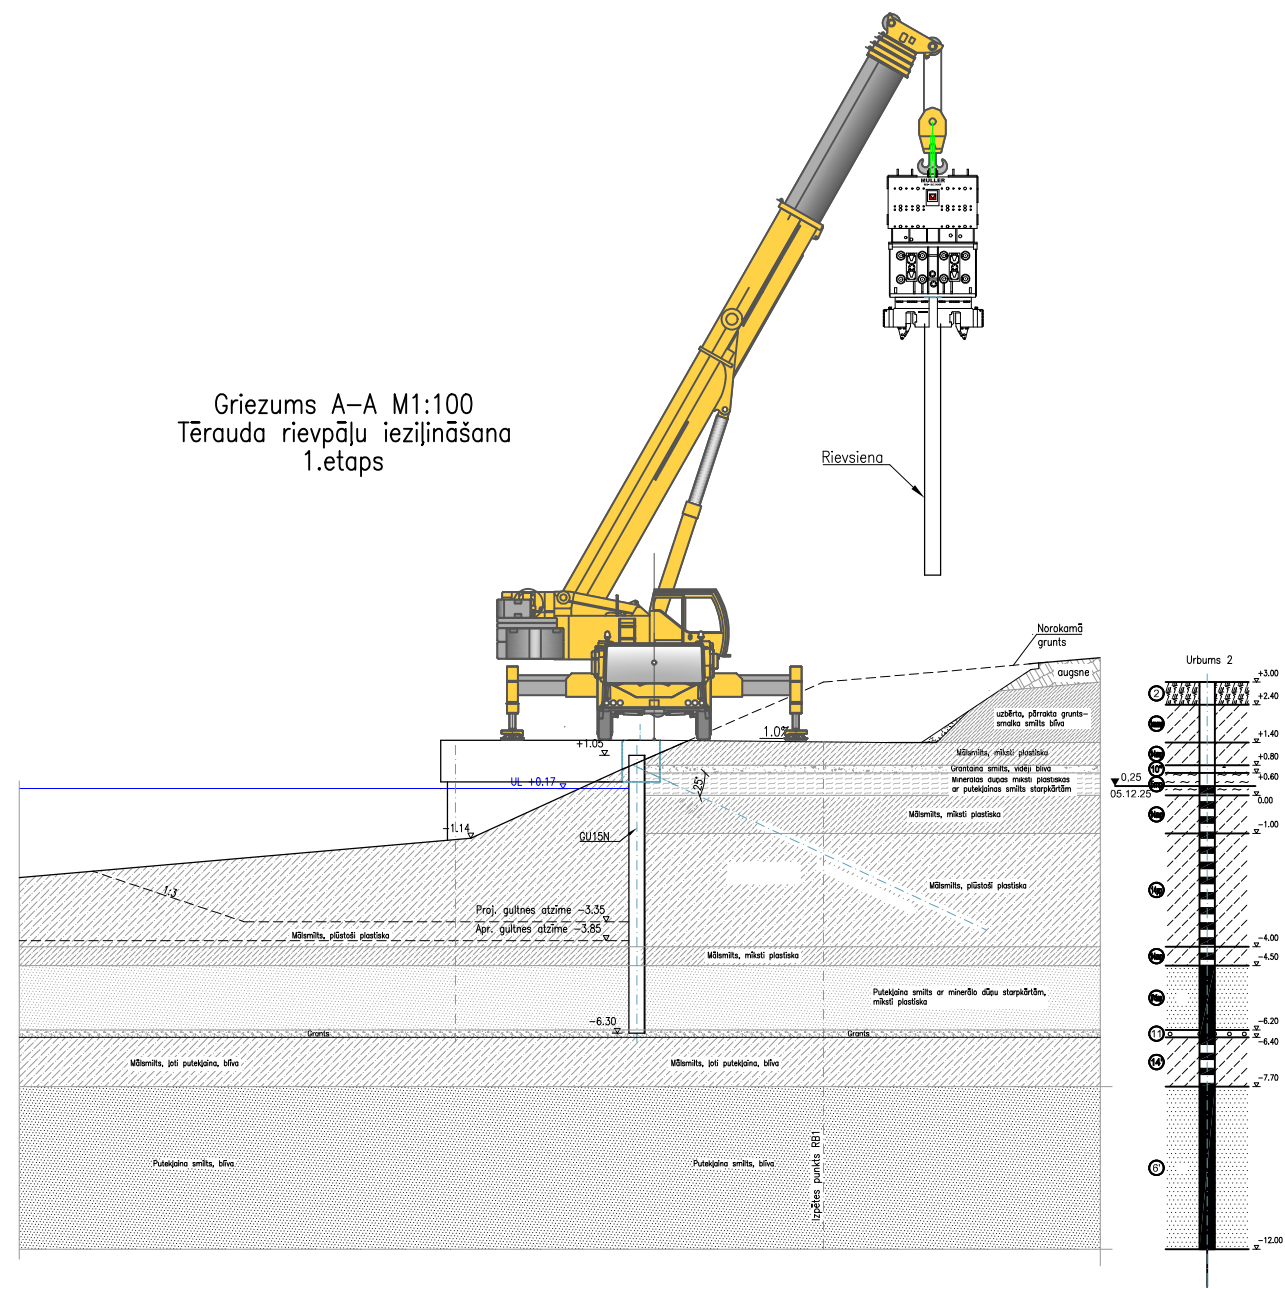

Piezīmes:

1. Izmēri ir doti milimetros, bet augstuma atzīmes un dziļuma atzīmes dotas metros (Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5).
2. Ģeotehniskā informācija saskaņā ar SIA "L.A.R." 2025–2026. gada inženierģeoloģisko izpēti objektā "Pāvilostas ostas piekrastes zonas labiekārtošana".
3. Griezumu izvietojumu skatīt rasējumā HB-2.

Būvdarbu veikšanas secība:

1. etaps. Tērauda rievsienu iedzīlinošāna uzsākot darbus no esošās piestātnes, un virzoties uz virzienā uz krastu. Grunts norakšana viršūdens daļā.
2. etaps. Tērauda sadales sija uzstādīšana un injekcijas enkuru uzstādīšana.
3. etaps. Gultnes padziļināšana pie iestātnes, grunti novietojot krastā un pēc liekā ūdens notecēšanas izvešana uz saskāņoto grunts atbērtni. Grunts norakšana krasta daļā un nogāzes veidošanas daļā līdz projekta atzīmei.
4. etaps. atlikušo piestātnes izbūves darbu pabeigšana: piestātnes virsbūves izbūve, grunts piebērsšana aiz rievsienu, nogāžu nostiprinājumu izbūve, segas konstrukcijas izbūve, piestātnes aprīkojuma montāža.

 		
---	--	--
